

Bunkersanierung ROT

Im Sommer 2020 mussten aufgrund von Lehmdurchmischungen mit Bunkersand und instabilen Bunkersohlen die Hälfte der Bunker auf ROT ausser Betrieb genommen werden. Zudem waren die Vorgreens der Spielbahn 1&9 immer sehr nass und weich.

Am 28.8.2020 hat die WGA das Baugesuch zur Sanierung eingereicht. Nach diversen Einsprachen haben wir die Genehmigung am 26.11.2020 erhalten, gleichzeitig ist leider der erste Schnee gefallen. Nach einem sehr nassen Jahresbeginn konnten die Arbeiten am 23.2.21 mit 5 Monaten Verspätung beginnen. Momentan lässt das gute Wetter die Arbeiten zu.


Wir haben mit den Vorgreensanierungen begonnen. 40 cm Lehm musste abgetragen, die Drainage entsprechend erweitert und mit Rasentragschicht neu aufgebaut werden. Diese Bereiche werden nun eingesät und sollen möglichst schnell wieder bespielbar sein.

Im April werden die grossen Bunker-Geländemodellierungen, Drainagen- und Bunkersohleneinbauten, im Mai die Blinder-Bunkersohlenausbauten vorgenommen. Im Juni können die Bunker mit den Durabunker-Rändern, der Bewässerung und den Rasensoden fertiggestellt werden. Nach einem Monat Einwachszeit werden wir im August die Bunker wieder in Betrieb nehmen können, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen.

Den Spielbetriebe auf ROT werden wir ab April auf den Löchern, welche nicht in Bearbeitung sind, mit Einschränkungen öffnen. Die Kombinationen werden situativ festgelegt.

Wir danken allen Mitgliedern für das Verständnis und die Geduld.

Roland Meyer

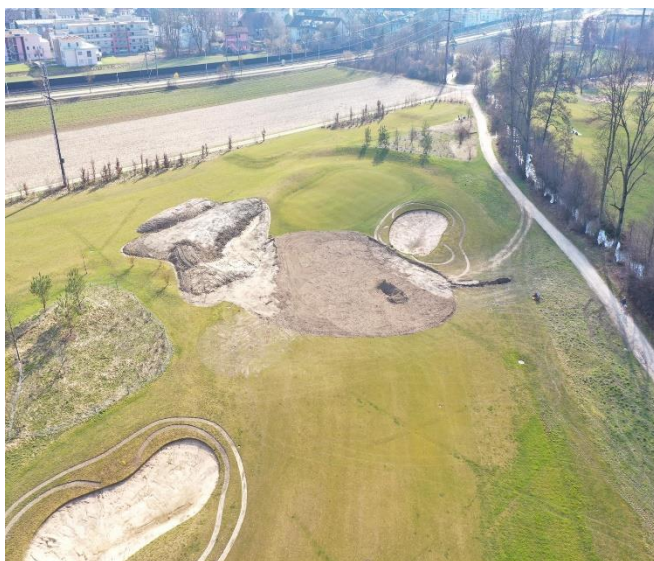

Vorgreensanierung auf der Spielbahn 1



Bodenaufbau der Vorgreens 1&9



Renaturierung Bunker Bahn 2



Geländemodellierung FW-Bunker 2



Neubau Vorgreen 1 und Bunkersanierung



Neubau Vorgreen 9 mit Bunkersanierung



Greenbunker Bahn 9



Greenumgebung Loch 9



Bunkermodellierung auf der Neun



Drainage Vorgreen 9
